

2.0 BUTIRAN JALAN TERLIBAT

2.1	NAMA JALAN	DAERAH	KAEDAH KERJA	KOORDINAT MULA	KOORDINAT AKHIR	JARAK (METER)
	JALAN SEKOLAH	KUALA TERENGGANU	Plinth	5.449964, 103.009587		1 X 1 Meter
	JALAN SEKOLAH	KUALA TERENGGANU	Kabinet	5.449964, 103.009587		1 X 1 Meter
	JALAN SEKOLAH, JALAN KG PECHAH ROTAN	KUALA TERENGGANU	Aerial Fiber Routing Backhaul (Anggaran)	5.449964, 103.009587	5.44356, 103.026797	2444 Meter (Anggaran)
	JALAN SEKOLAH, JALAN KG PECHAH ROTAN	KUALA TERENGGANU	Aerial Fiber Routing GPON (Anggaran)	5.449964, 103.009587	5.450786, 102.998142	1296 Meter (Anggaran)
JUMLAH JARAK PERMOHONAN						3740 Meter

CADANGAN TEKNIKAL UNTUK

SEKOLAH KEBANGSAAN PECHAH ROTAN



MAKLUMAT CADANGAN TEKNIKAL

Nama Site:	SEKOLAH KEBANGSAAN PECHAH ROTAN
Site ID:	TBA7012
Lokasi PoP Kabinet:	Jalan Sekolah
GPS Koordinat:	5.449964, 103.009587
Lokasi Laluan Fiber	Jalan Sekolah, Jalan Kg Pechah Rotan
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Mula-Anggaran)	5.449964, 103.009587
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Akhir-Anggaran)	5.44356, 103.026797
GPS Koordinat GPON: (Titik Mula-Anggaran)	5.449964, 103.009587
GPS Koordinat GPON: (Titik Akhir-Anggaran)	5.450786, 102.998142
Tarikh:	05/03/2024

Kandungan:

1. Ringkasan Pelaksanaan
2. Peta Penandaan Lokasi (Plinth Kabinet)
3. Gambar Lokasi (*Plinth* Kabinet)
4. Cadangan Laluan Kabel Fiber Pole
5. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan PoP *Plinth* Kabinet
6. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan Fiber

1. RINGKASAN PELAKSANAAN

1.1 Cadangan Pelaksanaan

Bil	Perkara	Kuantiti
1	PoP <i>Plinth</i> Kabinet Satu (1) unit	1
2	Jumlah Cadangan Fiber Pole 105 poles	105
3	Jumlah Jarak Fiber Pole (Anggaran) Backhul - 2444m GPON - 1296m	3740m


2. PETA PENANDAAN LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



 SEKOLAH KEBANGSAAN PECHAH ROTAN (TBA7012)

 POP

3. GAMBAR LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)

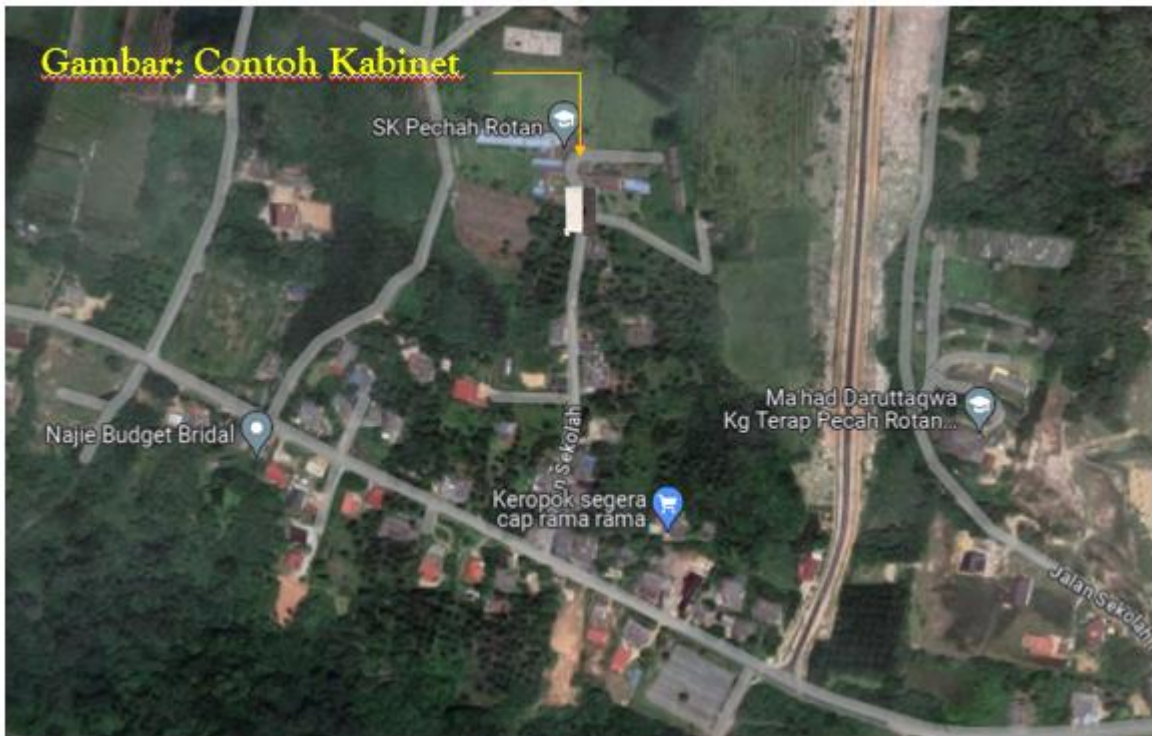

4. CADANGAN LALUAN KABEL FIBER POLE (ANGGARAN)


Backhaul



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

GPON



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

**5. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA AWAL
PELAKSANAAN
PoP *PLINTH* KABINET**

Bil	Perkara	Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<u>Kerja Civil, Teknikal dan, Elektrikal</u>															
1.1	Persiapan di Tapak	1														
1.2	Kerja Pemasangan <i>Plinth</i> PoP	1														
1.3	Kerja Pemasangan Kabinet, FDC & rectifier	1														

6. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA PELAKSANAAN FIBER

Bil	Perkara	Bulan /Minggu															
		Apr 2024			Mei 2024			Jun 2024									
		Minggu 3-4			Minggu 1-4			Minggu 1-2		Minggu 3-4							
1	Persiapan di Tapak	■															
2	Kerja Pengesahan Kabel	■															
3	Kerja Pengorekan		■	■													
4	Kerja Rentang Kabel				■	■	■										
5	Kerja Menimbus Tanah							■	■								
6	Kerja Penurapan Jalan/Pembersihan Tapak									■	■						
7	<i>Integration, Testing & Commissioning</i>												■	■	■		
8	Selesai																■

-Tamat-
